

BAUHERRENGEMEINSCHAFT




Oberingenieurkreis II
Tiefbauamt des Kantons Bern



Gemeinde Laupen



Sensetalbahn

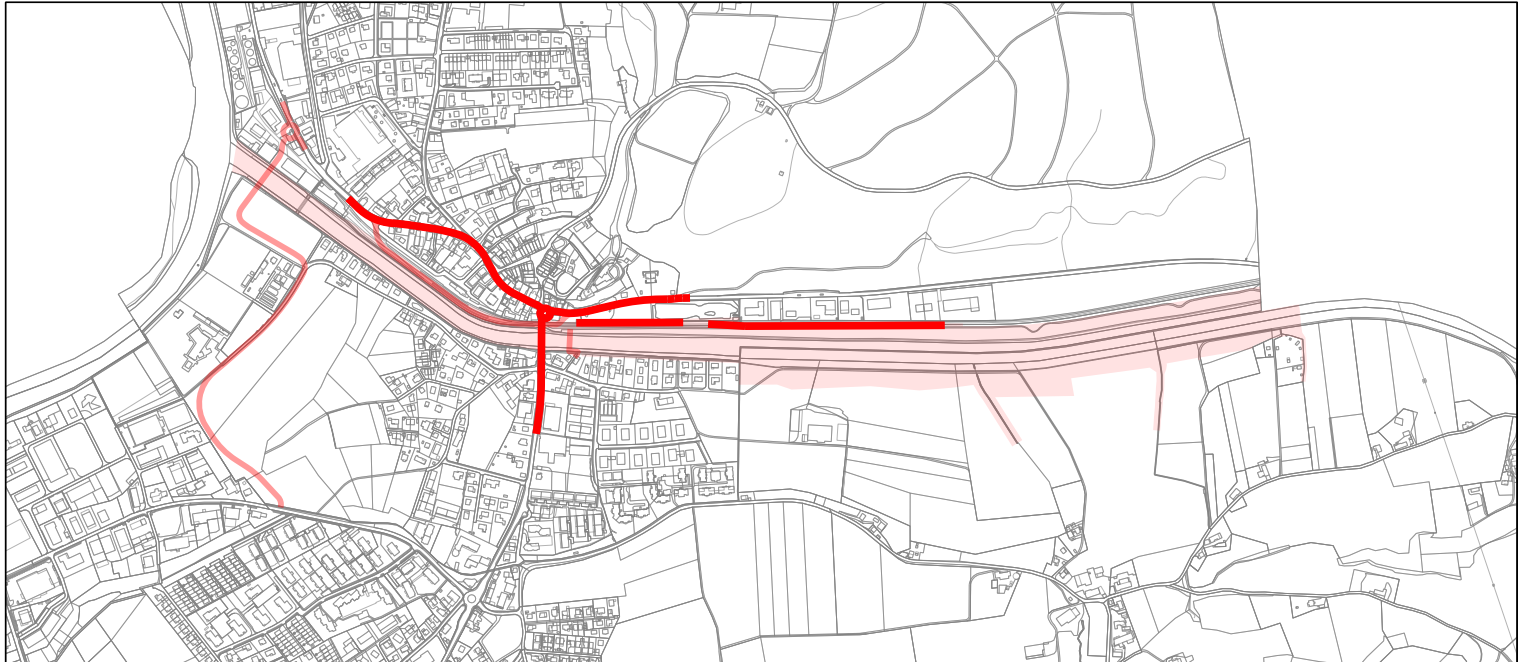

Master-Dokumentation

orientierende Beilage

LaUP!en

Verkehrssanierung und städtebauliche Entwicklung Laupen


Bauablauf und Grobtermine

PLANERGEMEINSCHAFT SENSseORIUM:

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| Roduner BSB + Partner AG Ingenieure und Planer 3097 Liebefeld <input checked="" type="checkbox"/> | CSD Ingenieure AG 3097 Liebefeld <input type="checkbox"/> | Maurus Schifferli Landschaftsarchitekten AG 3011 Bern <input type="checkbox"/> | Schär Buri Architekten BSA SIA 3006 Bern <input type="checkbox"/> | ingenta ag ingenieure und planer 3000 Bern 31 <input type="checkbox"/> |
|--|---|---|--|---|

| Index | Datum | Aenderungen | gez. | gepr. | gen. | Liebefeld, 10.08.2018 | geprüft: | genehmigt: |
|-------|-------|-------------|------|-------|------|-----------------------------|---------------------------------|------------|
| | | | | | | gezeichnet: | Plan Nr. 90472 / M1-3 | |
| | | | | | | Grösse: | | |
| | | | | | | user: nst | | |
| | | | | | | gedruckt: 07-AUG-2018 13:29 | | |

Gesamtvorhaben

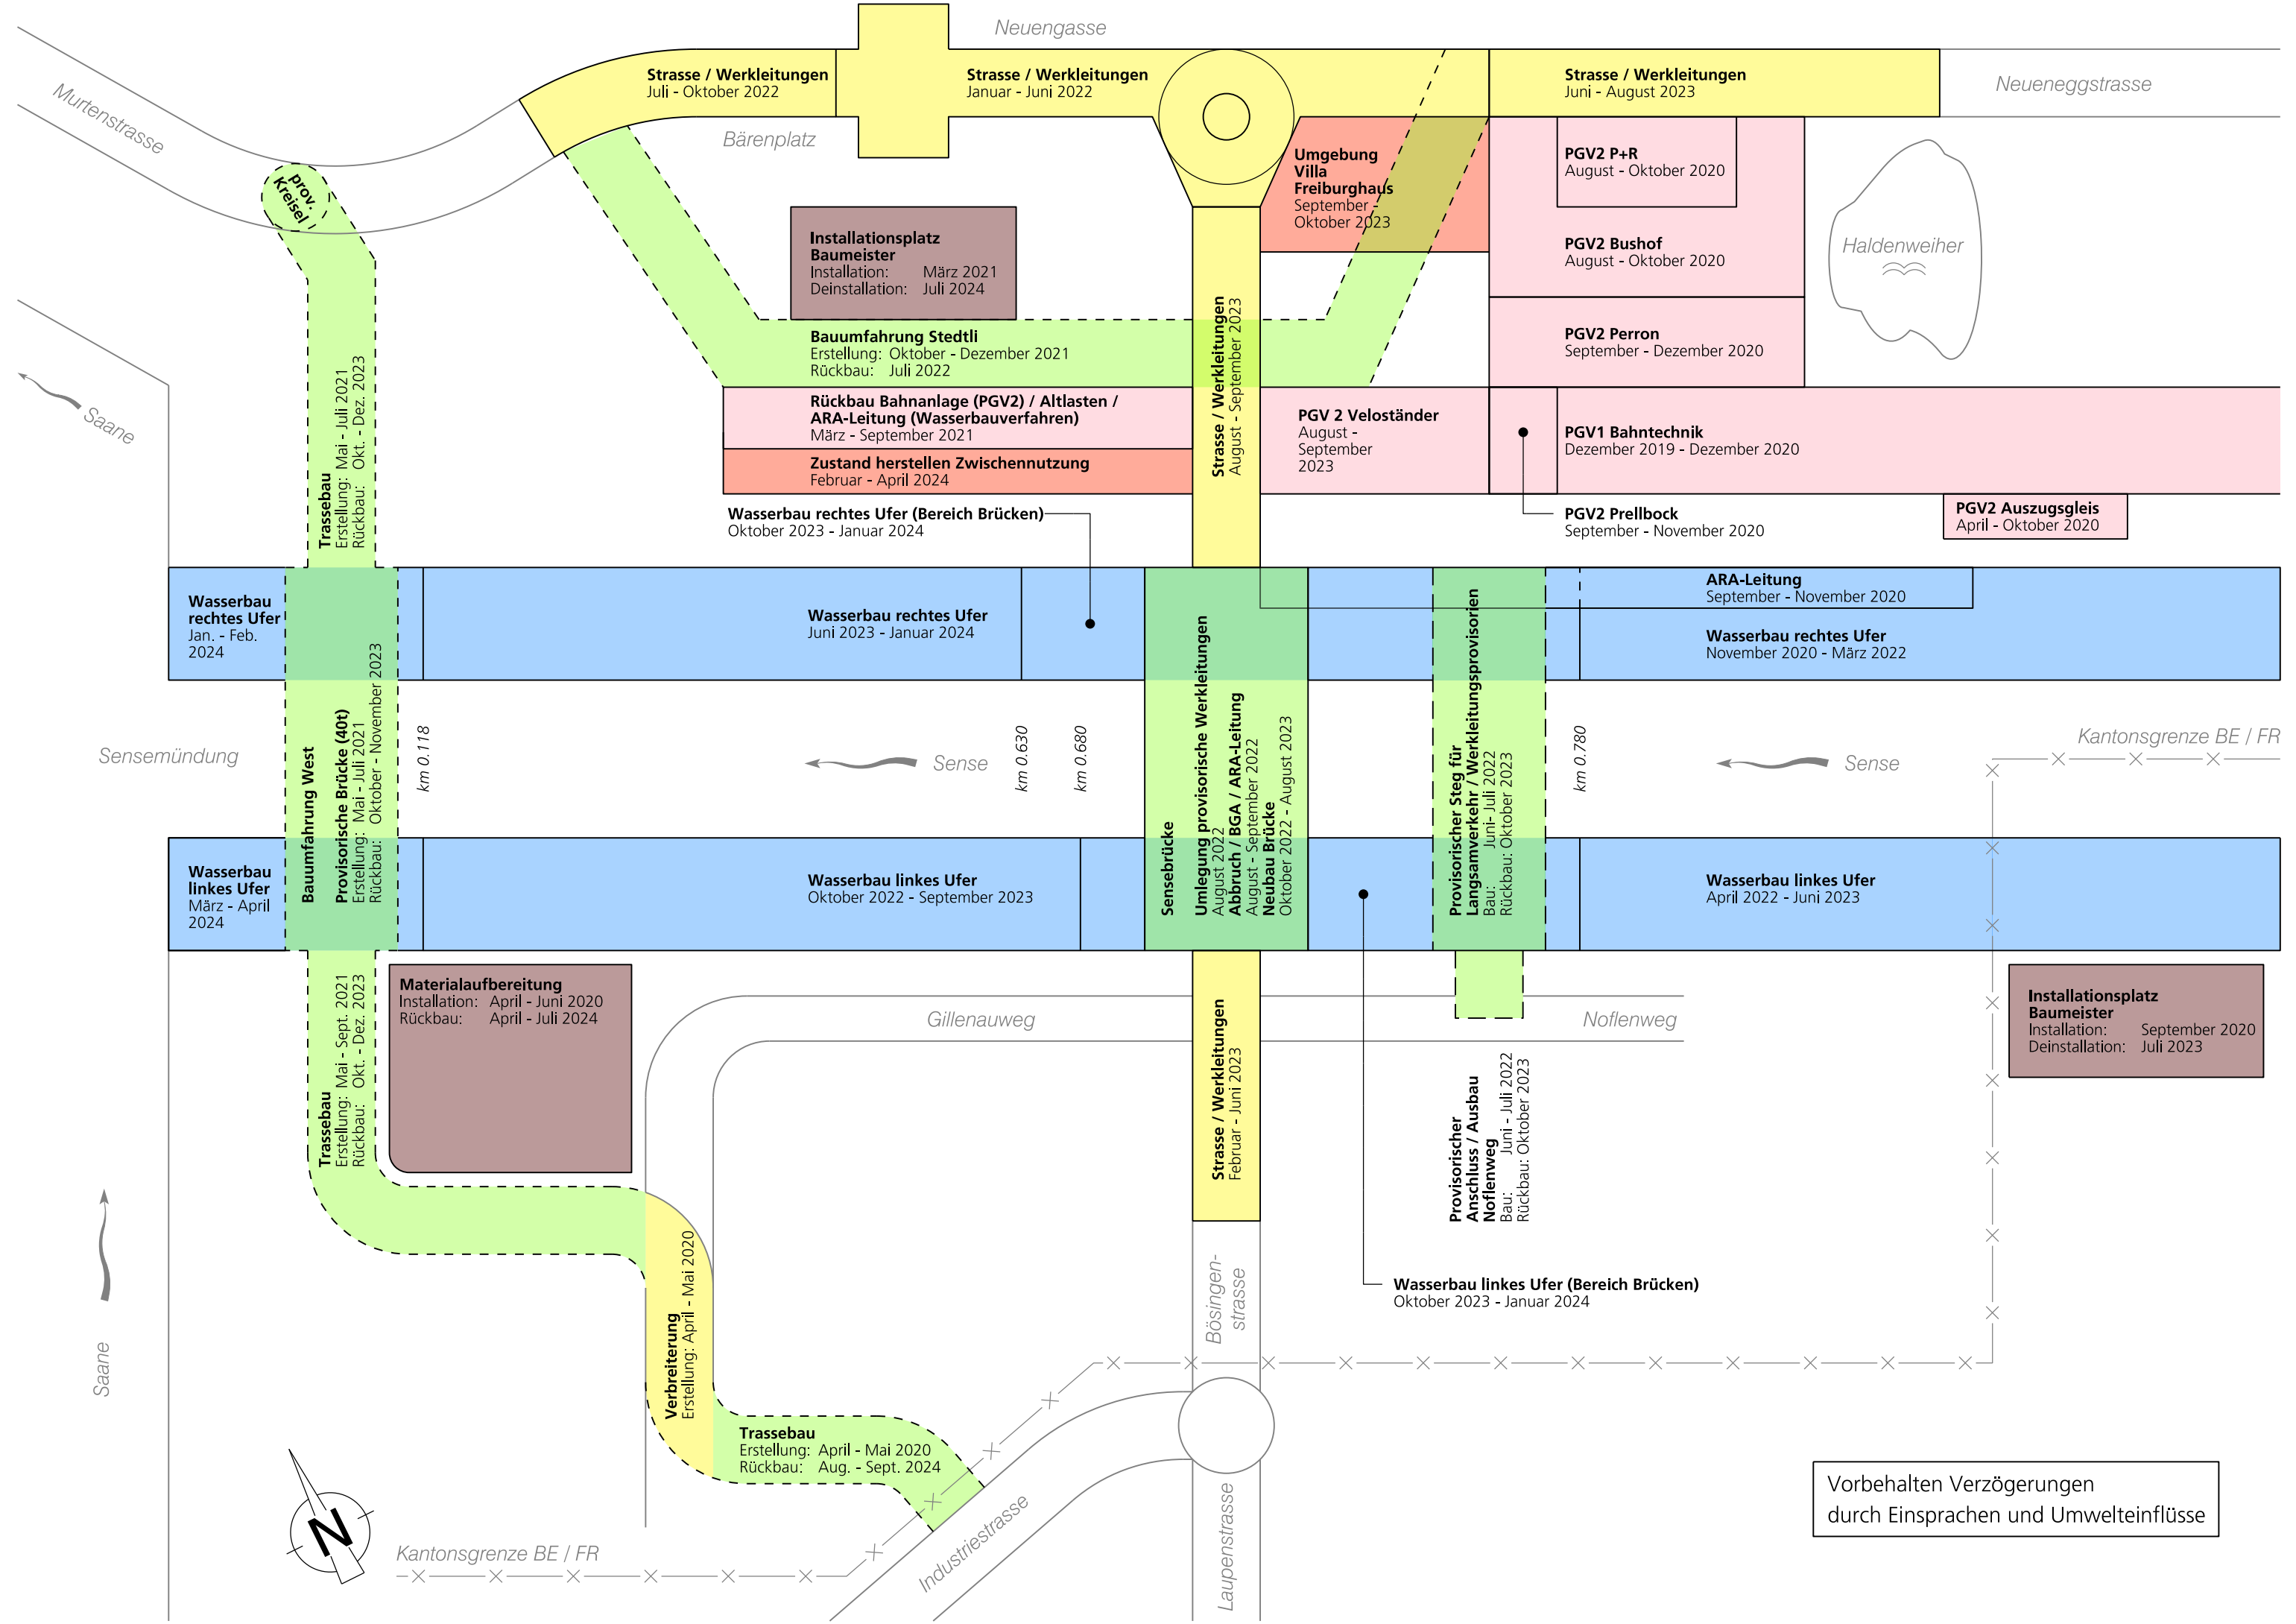

Neuengasse

Neueneggstrasse

Strasse / Werkleitungen
Juli - Oktober 2022

Strasse / Werkleitungen
Januar - Juni 2022

Strasse / Werkleitungen
Juni - August 2023

Bärenplatz

Umgebung
Villa
Freiburghaus
September -
Oktober 2023

PGV2 P+R
August - Oktober 2020

PGV2 Bushof
August - Oktober 2020

PGV2 Perron
September - Dezember 2020



Installationsplatz
Baumeister
Installation: März 2021
Deinstallation: Juli 2024

Baumfahung Stedli
Erstellung: Oktober - Dezember 2021
Rückbau: Juli 2022

Rückbau Bahnanlage (PGV2) / Altlasten /
ARA-Leitung (Wasserbauverfahren)
März - September 2021

Zustand herstellen Zwischennutzung
Februar - April 2024

Strasse / Werkleitungen
August - September 2023

PGV 2 Veloständer
August -
September
2023

PGV1 Bahntechnik
Dezember 2019 - Dezember 2020

PGV2 Prellbock
September - November 2020

PGV2 Auszugsgleis
April - Oktober 2020

Wasserbau rechtes Ufer (Bereich Brücken)
Oktober 2023 - Januar 2024

Wasserbau
rechtes Ufer
Jan. - Feb.
2024

Wasserbau rechtes Ufer
Juni 2023 - Januar 2024

ARA-Leitung
September - November 2020

Wasserbau rechtes Ufer
November 2020 - März 2022

Sensemündung

Sense

km 0.630

km 0.680

km 0.780

Sense

Kantonsgrenze BE / FR

Wasserbau
linkes Ufer
März - April
2024

Wasserbau linkes Ufer
Oktober 2022 - September 2023

Wasserbau linkes Ufer
April 2022 - Juni 2023

Baumfahung West
Provisorische Brücke (40t)
Erstellung: Mai - Juli 2021
Rückbau: Oktober - November 2023

km 0.118

Sensesebrücke
Umliegung provisorische Werkleitungen
August 2022
Abbruch / BGA / ARA-Leitung
August - September 2022
Neubau Brücke
Oktober 2022 - August 2023

Provisorischer Steg für
Langsamverkehr / Werkleitungsprovisorien
Bau: Juni - Juli 2022
Rückbau: Oktober 2023

Trassebau
Erstellung: Mai - Sept. 2021
Rückbau: Okt. - Dez. 2023

Materialaufbereitung
Installation: April - Juni 2020
Rückbau: April - Juli 2024

Gillenuweg

Noflenweg

Strasse / Werkleitungen
Februar - Juni 2023

Provisorischer
Anschluss / Ausbau
Noflenweg
Bau: Juni - Juli 2022
Rückbau: Oktober 2023

Wasserbau linkes Ufer (Bereich Brücken)
Oktober 2023 - Januar 2024


Installationsplatz
Baumeister
Installation: September 2020
Deinstallation: Juli 2023

Verbreiterung
Erstellung: April - Mai 2020

Trassebau
Erstellung: April - Mai 2020
Rückbau: Aug. - Sept. 2024

Bösingen-
strasse

Saane



Kantonsgrenze BE / FR

Industriestrasse


Laupenstrasse

Vorbehalten Verzögerungen
durch Einsprachen und Umwelteinflüsse

Bauphasen


Bauphase 2: Rückbau alter Bahnhof, Installationsplatz, Baumfahung West, Wasserbau rechtsufrig

Jahr 2021

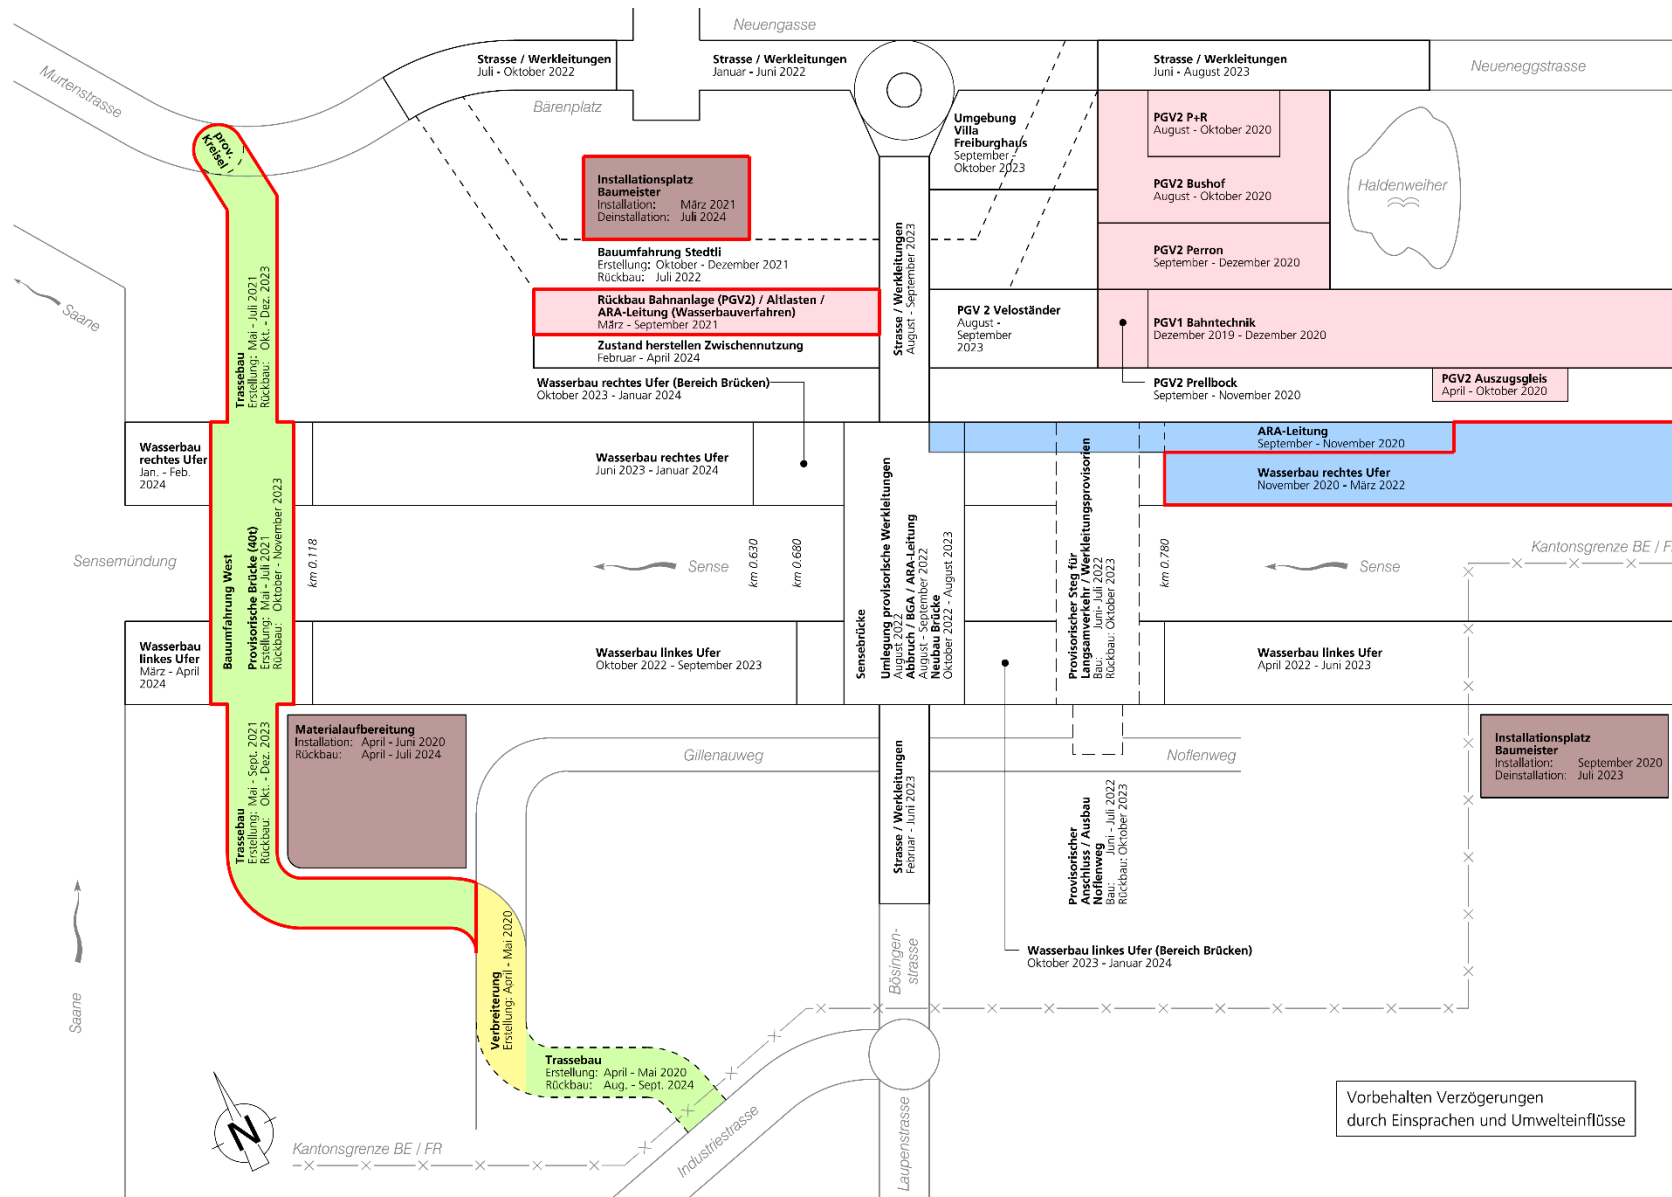

Bauphase 3: Bauumfahrung Stedtli, Sanierung Neuengasse/Bärenplatz

Jahre 2021-2022

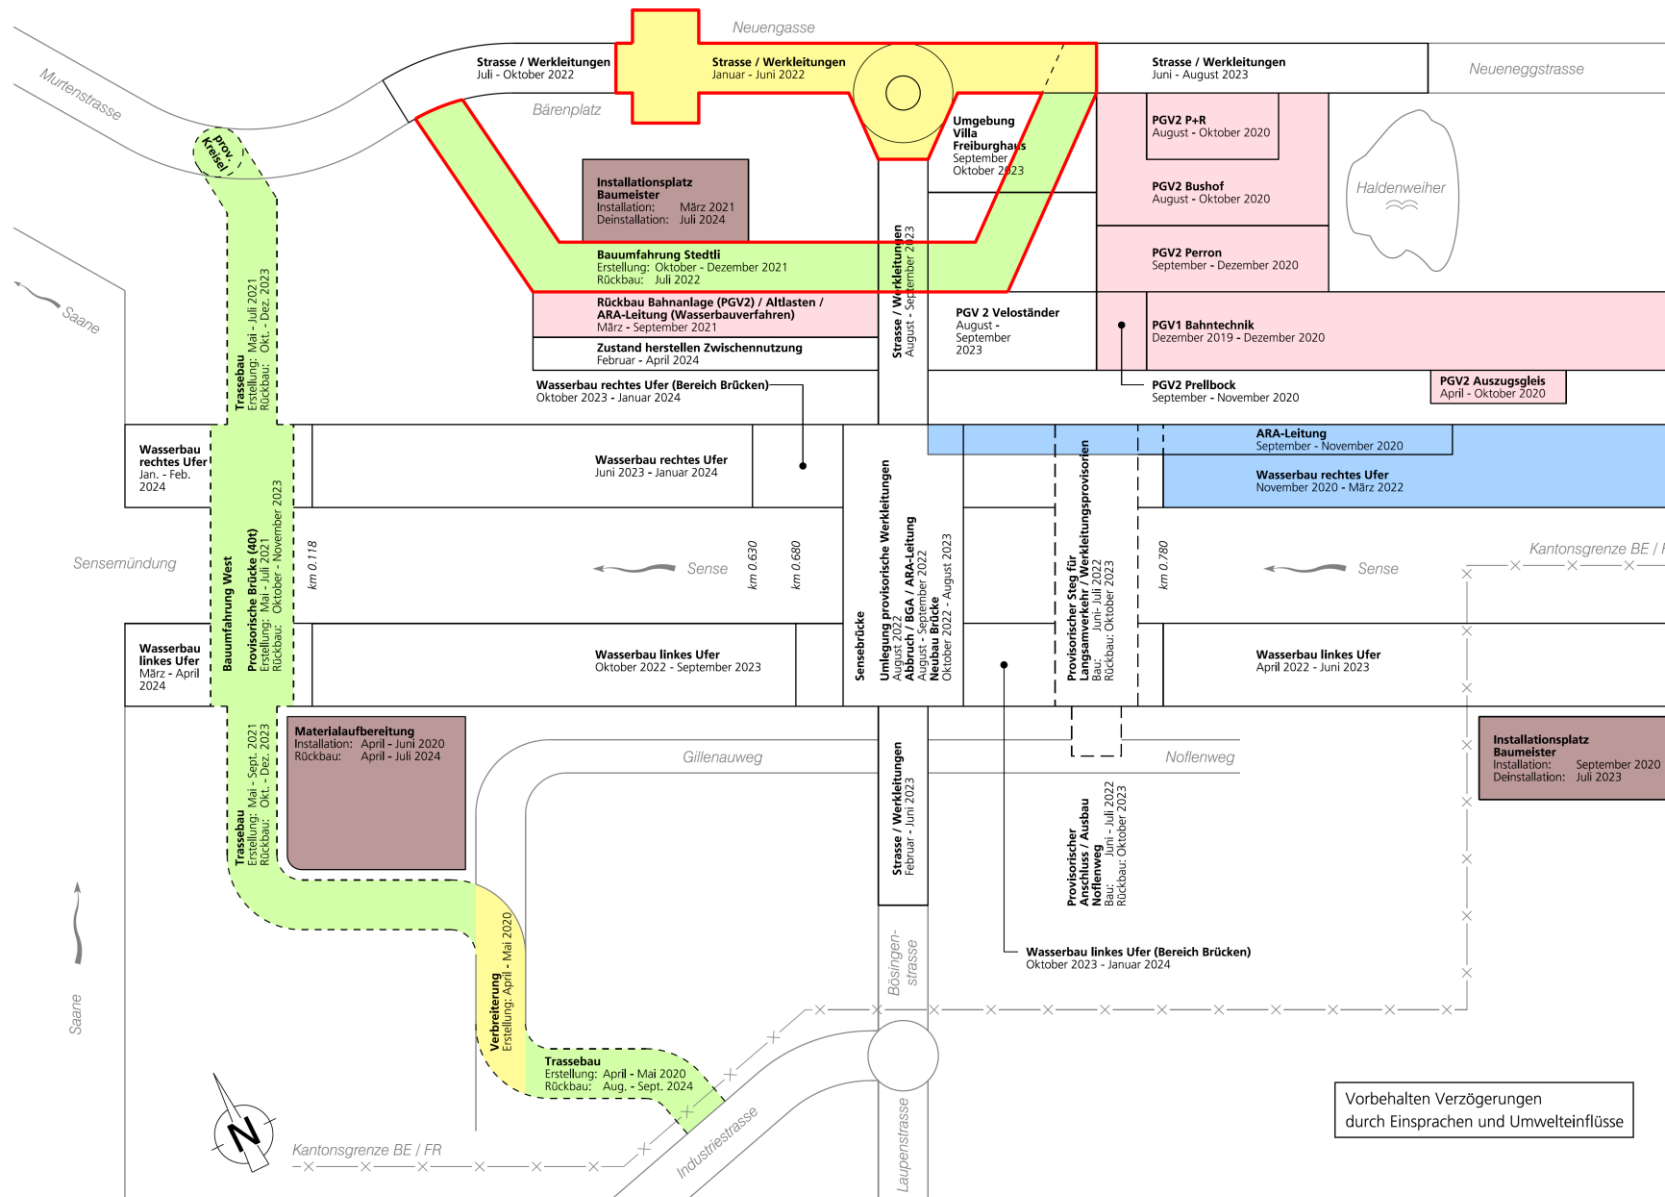

Bauprogramm

Stand: 10.08.2018

